 ๗.๑๑.๕๖
 (นายปริญญา ยมะสมิต)
 พล. ๕๕๕

[illegible]


(นายพรศักดิ์ ปานน้อย)
ผู้อำนวยการกองออกแบบระบบท่อจำหน่ายน้ำ

ประปา
เพื่อประชาชน

ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๖๑๓ อาคารสำนักงานใหญ่

- วาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
- วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ แนวทางในการพิจารณาให้ทุนการศึกษาพนักงานในสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง (ฝบค.)
- วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน โดยรายงาน
ทั้งงานที่ค้างดำเนินการจากปี ๒๕๕๖ และงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
(เรียงลำดับ ดังนี้ ฝสร., ฝมส., ฝบค., ฝกผ., ฝกจ.๑,๒, ฝกจ.๓,๔)
- วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานของกองออกแบบระบบท่อจ่ายน้ำ ประจำเดือน ตุลาคม 2556

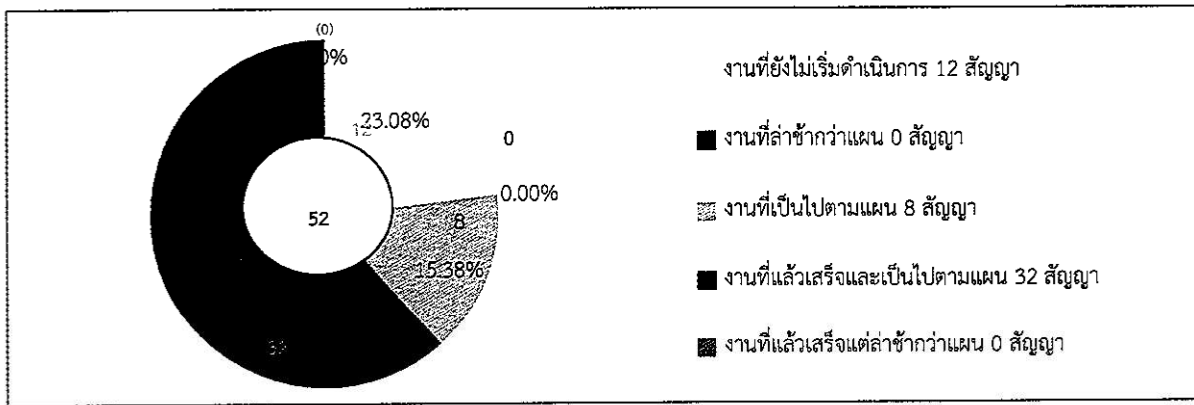

กองฯ มีงานที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 ทั้งหมด ดังนี้

แหล่งเงิน	งานตามแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	งานนอกแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	รวมจำนวน (สัญญา)
งบประมาณโครงการ 7	12	9	21
งบประมาณโครงการ 8	-	5	5
งบลงทุนปกติ	6	35	41
งบทำการ	0	3	3
รวมจำนวน (สัญญา)	18	52	70

สถานภาพของการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2556

งานที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ	12	สัญญา	คิดเป็น	23.08%
งานที่ล่าช้ากว่าแผน	0	สัญญา	คิดเป็น	0.00%
งานที่เป็นไปตามแผน	8	สัญญา	คิดเป็น	15.38%
งานที่แล้วเสร็จและเป็นไปตามแผน	32	สัญญา	คิดเป็น	61.54%
งานที่แล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าแผน	0	สัญญา	คิดเป็น	0.00%
งานทั้งหมด	52	สัญญา	คิดเป็น	100.00%

เดือน ตุลาคม 2556 มีงานที่ล่าช้ากว่าแผนมีจำนวน - สัญญา ประกอบด้วย

สัญญา	สาเหตุของความล่าช้า	แนวทางการแก้ปัญหา

เรียน ผอ.ฟสร.

เพื่อโปรดทราบ

งานในแผนปฏิบัติงานประมาณ 2557

แผนและผลงานการดำเนินงาน โครงการฯ 7 ปีงบประมาณ 2557
 กองออกแบบระบบท่อจ่ายน้ำ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

โครงการขยายบริการให้ดื่มพื้นที่ที่ชุมชนมีอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ระยะที่ 2 และเพิ่มเติมในระยะที่ 1

28-ค.ค.-56

ลำดับ ที่	สาขา	สัญญา	รายการ	ขนาด (มม.)	ความยาว (กม.)	วงเงิน (ล้านบาท)	FY 2556	FY 2557												FY 2558	ผลงาน (%)	ดำเนินการ โดย	แผนงาน		สถานะ	หมายเหตุ	
								ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.				ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.	เม.ย.
1			โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่ม เกล้าช่วง 1	300																							
2			โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่ม เกล้าช่วง 2	300																							
3			โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่ม เกล้าช่วง 3	300																							
4			โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่ม เกล้าช่วง 4	300																							
5			โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่ม เกล้าช่วง 5	300																							
6			โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่ม เกล้าช่วง 6	300																							

หมายเหตุ
 แผนการสำรวจและออกแบบ
 ขออนุญาต
 ประกาศประกวดราคาและจัดหาผู้รับจ้าง
 ดำเนินการก่อสร้าง
 X = % ผลงานที่ทำได้แต่ละเดือน
 จัดทำรับงาน



งานในแผนปีงบประมาณ 2557
 (รอแผนแนบนอนจาก ผบค.)

แผนและผลลงงานการดำเนินงาน โครงการ 7 ปีงบประมาณ 2557

กองออกแบบระบบท่อจ่ายน้ำ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

โครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ชุมชนเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ ระยะที่ 2 และเพิ่มเติมในปีระยะที่ 1

28-ค.ค.-56

ลำดับ ที่	สาขา	สัญญา	รายการ	ขนาด (มม.)	ความยาว (กม.)	วงเงิน (ล้านบาท)	FY 2557												FY 2558	ผลงาน (%)	ดำเนินการ โดย	แผนงาน		สถานะ	หมายเหตุ	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				แผนงาน	ทำจริง		ปัญหา	การแก้ไข
7			โครงการก่อสร้างถนนเส้นมิตร - ร่ม เกล้าช่วง 7	300																						
8			ทางรถยนต์พัฒนาการ-รามคำแหง- ถาวรวิชัย	300																						
9			ซอยพระราม 2 ซอย 82	300																						
10			สะพานลอยข้ามแยกจุดตัดทางหลวง หมายเลข 3256 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 3268 รวมสะพานลอยข้ามคลองลำโรง																							มท.5450-1-2/19244 ทว. 5 กันยายน 2556
11			บางปลากรด - ป้อมพระจุล																							มท.5450-1-2/19244 ทว. 5 กันยายน 2556
12			โครงการก่อสร้างรั้วคานาถึงศรี - สาม แยกหมู่บ้านเอื้ออาทร อบจ.นนทบุรี																							มท.5450-1-2.3/22547 สว.14 ตุลาคม 2556

หมายเหตุ

แผนการสำรวจและออกแบบ
ข้อมูลชุด
ประเภทประกาศราคาและจัดหาผู้รับจ้าง
ดำเนินการก่อสร้าง
X = % ผลงานที่ได้แต่ละเดือน
จัดทำปริมาณงาน

งานที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
งานที่ล่าช้ากว่าแผน
งานที่เป็นไปตามแผน
งานที่เสร็จแล้วและเป็นไปตามแผน
งานที่เสร็จแล้วแต่ล่าช้ากว่าแผน

งานในแผนปีงบประมาณ 2557
(รออนแผนเน้นนอนจาก ผบค.)

งานออกแบบและผลงานการดำเนินงาน โครงการฯ 8 ปีงบประมาณ 2557
กองออกแบบระบบท่อจ่ายน้ำ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ


28-ต.ค.-56

ลำดับ ที่	สาขา	สัญญา	รายการ	ขนาด (มม.)	ความยาว (กม.)	วงเงิน (ล้านบาท)	FY 2557												FY 2558			ผลงาน (%)	ดำเนินการ โดย	แผนงาน		สถานะ	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							FY 2556			ช.บ.	อ.บ.	อ.บ.	ช.บ.	อ.บ.	อ.บ.	ช.บ.	อ.บ.	อ.บ.	ช.บ.	อ.บ.	อ.บ.			ช.บ.	อ.บ.		อ.บ.	แผนงาน	ทำจริง	ปัญหา	การแก้ไข																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	สสนบ.	PITB-803 (เดิม PITB-718)	1. ถนนประชาร่วม 16-มิตร ไม่ตรี (ตลอดสาย) 2. บริเวณทางเชื่อมระหว่างถนนประชาร่วม 16-มิตร ไม่ตรี กับรางรถไฟคู่สายเดียววิ่ง 5 แห่ง	1,200	14.30	473.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

หมายเหตุ

SSD
PM
ABE
C
X

แผนการสำรวจและออกแบบ
ของผู้อudit
จัดจ้างประกวดราคา
ดำเนินการก่อสร้าง
X = % ผลงานที่ทำได้แต่ละเดือน



งานที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
งานที่ล่าช้ากว่าแผน
งานที่เป็นไปตามแผน
งานที่เสร็จและยังไม่ไปตามแผน
งานที่เสร็จแต่ล่าช้ากว่าแผน

งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จปี 56 แต่ยัง ไม่ ได้จัดจ้าง และ/หรือ
รอข้อมูลจากหน่วยงานนอก

งานออกแบบและผลงานการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 (งบลงทุนปกติ)
กองออกแบบระบบท่อจ่ายน้ำ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

28-ต.ค.-56

ลำดับที่	สาขา	สัญญา	รายการ	ขนาด (มม.)	ความยาว (กม.)	วงเงิน (ล้านบาท)	FY 2557												FY 2558			ผลงาน (%)	ดำเนินการ โดย	แผนงาน		สถานะ	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							FY 2556	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ			งบฯ	งบฯ		งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ

งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จปี 56 แต่ยังไม่ได้จัดจ้าง และ/หรือ รอข้อสรุปจากหน่วยงานภายนอก

งานออกแบบและผลงานการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 (งบลงทุนปกติ)
กองออกแบบระบบท่อจ่ายน้ำ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

28-ต.ค.-56

ลำดับที่	สาขา	สัญญา	รายการ	ขนาด (มม.)	ความยาว (กม.)	วงเงิน (ล้านบาท)	FY 2557												FY 2556			ปริมาณ (ตัน)	ค่าปริมาณ (%)	ดำเนินการ โดย	แผนงาน		สถานะ	หมายเหตุ					
							ช.บ.	ช.ม.	ช.ค.	ช.ด.	ช.อ.	ช.ก.	ช.ข.	ช.ช.	ช.ส.	ช.ห.	ช.ท.	ช.ด.	ช.ค.	ช.อ.	ช.ก.				ช.ข.	ช.ช.		ช.ส.	ช.ห.	ช.ท.	แผนงาน	ทำจริง	สัญญา
10	สสช.	รพ.61	โครงการปรับปรุงสะพานคลองทองปรี	1200 300	1.23	30.00													S&D							100	สปอ.	บ.บ.55 - กค. 55	ส่งเอกสารให้ กอป. ดำเนินการ ต่อ				
11	สสช.	รพ.62	โครงการก่อสร้างถนนอุโมงค์ดิน สาย ช่วงที่ 3	300	1.20	4.50													S&D							100	สปอ.	บ.บ.55 - คค.55	ส่งเอกสาร ผบ.ร.อ.จังหวัด				
12	สสช.	รพ.66	โครงการซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงทางขึ้นฝั่ง และทางระบายน้ำบริเวณท้ายฝาย	300 1000	3.4 0.15	15.50													S&D							100	สปอ.	กค.55 - กค. 56	ส่งเอกสารให้ กอป. ดำเนินการ ต่อ				
13	สสช.	รพ.67	โครงการก่อสร้างขุดลอกคูคลอง ของถนนอุโมงค์ดิน และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	300	1.30	4.00													S&D							100	สปอ.	กค.55 - กค. 56	ยกเลิกงาน สาขา บางกอกน้อย ดำเนินการ				
14	สสช.	รพ.68	โครงการซ่อมแซมถนนทรานคา-พุทธมณฑลสาย 4 กับ สะพาน พระราม 8	300 1000	1.7 3.00	188.00														10						10	สปอ.	กค.55 - กค. 57	รอแบบและ แผนงาน กทม.				
15	สสช.	รพ.74	งานรื้อย้ายและวางท่อประปาใหม่ทดแทนพร้อมเปลี่ยน Box culvert เป็นสะพานคอนกรีต. ทางหลวงหมายเลข 34 สะพานข้าม คลองกุ่มที่ 30+467 บริเวณทางนาหนอง	400	0.20	2.00													S&D							100	สอจ. 3,4	คค.55 - กค. 56	ส่งเอกสาร ให้ที่ปรึกษาแล้ว				
16	สสช.	รพ.75	งานรื้อย้ายและวางท่อประปาใหม่ทดแทนพร้อมเปลี่ยน Box culvert เป็นสะพานคอนกรีต. ทางหลวงหมายเลข 34 สะพานข้าม คลองกุ่มที่ 18+486 บริเวณทางนาหนอง	400	0.20	2.00														25						25	สอจ. 3,4	คค.55 - กค. 57	คาดว่าจะยกเลิก สัญญา				
17	สสช.	รพ.76	งานรื้อย้ายและวางท่อประปาใหม่ทดแทน พร้อมโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีต. ทางหลวงหมายเลข 34 งานเปลี่ยนช่วง span ใหม่เพื่อขยายความยาวรถช่วงคลองลาดน้ำบริเวณสะพาน	1000 400	0.06 0.30	10.50													S&D							100	สอจ. 3,4	คค.55 - กค. 56	ดำเนินการแล้ว เสร็จในส่วน ของท่อจ่ายน้ำ				
18	สสช.	รพ.77	งานรื้อย้ายและวางท่อประปาใหม่ทดแทน พร้อมโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีต. ทางหลวงหมายเลข 34 งานเปลี่ยนช่วง span ใหม่เพื่อขยายความยาวรถช่วงคลองลาดน้ำบริเวณสะพาน	1000 400	0.075 0.15 0.15	11.50													S&D							100	สอจ. 3,4	คค.55 - กค. 56	ดำเนินการแล้ว เสร็จในส่วน ของท่อจ่ายน้ำ				
19	สสช.	รพ.78	งานรื้อย้ายและวางท่อประปาใหม่ทดแทน พร้อมโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีต. ทางหลวงหมายเลข 34 งานเปลี่ยนช่วง span ใหม่เพื่อขยายความยาวรถช่วงคลองลาดน้ำบริเวณสะพาน	1000 400	0.075 0.30	12.00													S&D							100	สอจ. 3,4	คค.55 - กค. 56	ดำเนินการแล้ว เสร็จในส่วน ของท่อจ่ายน้ำ				

งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จปี 56 แต่ยังไม่ได้จัดจ้าง และ/หรือ รอข้อสรุปจากหน่วยงานภายนอก

งานนอกแผนและผลงานการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 (งบลงทุนปกติ)
กองออกแบบระบบท่อจ่ายน้ำ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

28-ต.ค.-56

ลำดับที่	สาขา	สัญญา	รายการ	ขนาด (มม.)	ความยาว (กม.)	วงเงิน (ล้านบาท)	FY 2557												ผลงาน (%)	คำกั้นการ โดย	แผนงาน		สถานะ	หมายเหตุ	
							FY 2556	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.			แผนงาน	ทำจริง		ปัญหา	การแก้ไข
30	สศค.	รพ.๑4	งานร้อยท่อและวางท่อประปาใหม่ ในซอยบงกระดี่ 16 ซกก. บางกระดี่ ถึง จุดสิ้นสุดการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลทุ่งกระดี่	100	1.90	6.30	S&D												100	๑๐๐.3,4	1 ก.ค.56 - 31 ต.ค.56	30 ก.ค. 56	อยู่ระหว่างทำ ราคากลาง		
				200																					
31	สศค.	รพ.๑5	งานร้อยท่อและวางท่อประปาใหม่ ในถนนอมบัยวนเจริญ จาก คลองรางไผ่ ถึง ลำกระโคงการระณะ	300	1.10	4.00	S&D												100	๑๐๐.3,4	1 ก.ค.56 - 31 ต.ค.56	30 ก.ค. 56	อยู่ระหว่างทำ ราคากลาง		
32	สศค.	รพ.๑6	งานร้อยท่อและวางท่อประปาใหม่ ในถนนอมบัยวนเจริญ จาก คลองรางไผ่ ถึง แนวทำถนนที่คลองสน	300	1.52	4.50	10												10	๑๐๐.3,4	1 ก.ค.56 - 31 ต.ค.57		ประสาน สศค. ช่วยดำเนินการ	รอ กทม. แก้ไขปัญหา เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน เอกชน	รอเรื่องจาก กทม.
33	สศค.	รพ.๑7	งานร้อยท่อและวางท่อประปาใหม่ พร้อมโครงการปรับปรุงถนนบางกระหว- ไทรน้อย พร้อมวางระบบบำบัดน้ำเสีย อุตสาหกรรมคลองรังสิต 19 ถึง ปากซอยบางกระหว-ไทรน้อย 14 (ชุมชนศรีรัชกิจ)	300	1.80	7.52	S&D												100	๑๐๐.3,4	1 ก.ค.56 - 31 ต.ค.56	22 ก.ค. 56	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR		
34	สศค.	รพ.๑8	โครงการเชื่อมถนนมิตรภาพไฮดรี้- ถนนวิภาวดีรังสิต จอม กทม.	300	0.50	3.20	S&D												100	๑๐๐.3,4	1 ต.ค.56 - 31 ต.ค.56	6 ต.ค. 56	รอถนนเสร็จขอ TOR		
35	สศค.	รพ.๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนนถนนมิตรภาพไฮดรี้ ๑.๑ กับถนนกาญจนาภิเษก- ช่อบุรี และถนนกาญจนาภิเษก																		ปีงบประมาณ 58				

หมายเหตุ

แผนการสำรวจและออกแบบ
ขอยุทธ
จัดจ้างประกาศราคา
ดำเนินการก่อสร้าง
X - % ผลงานที่ทำได้แต่ละเดือน

งานที่ยังไม่เริ่มต้น
งานที่กำลังดำเนินการ
งานที่เสร็จสิ้น
งานที่เสร็จสิ้นและเปิดไปจนหมด
งานที่เสร็จสิ้นและเปิดไปจนหมด
งานที่เสร็จสิ้นและเปิดไปจนหมด

งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จปี 56 แต่ยังไม่ได้จัดจ้าง และ/หรือ รอข้อสรุปจากหน่วยงานภายนอก

งานนอกแผนและผลจากการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 (งบทำการ)

กองออกแบบระบบท่อจ่ายน้ำ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

28-ค.ค.-56

ลำดับที่	สาขา	สัญญา	ลักษณะรายการ	ขนาด (มม.)	ความยาว (กม.)	วงเงิน (ล้านบาท)	FY 2557												FY 2558		ผลงาน (%)	ดำเนินการ โดย	แผนงาน		สถานะ	หมายเหตุ				
							อ.บ.	อ.บ.	อ.บ.	อ.บ.	อ.บ.	อ.บ.	อ.บ.	อ.บ.	อ.บ.	อ.บ.	อ.บ.	อ.บ.	อ.บ.	อ.บ.			อ.บ.	อ.บ.		อ.บ.	อ.บ.	อ.บ.	อ.บ.	อ.บ.
1	สสน.	-	ปรับปรุงระบบท่อรับสายทูลา	-	-	5														25	สง. 1,2	ด.ค.56-ค.ค. 57	ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ							
2	สสน.	-	ปรับปรุงระบบท่อรับคูใหญ่	-	-	3.5														100	สง. 1,2	ด.ค.55-ค.ค. 56	ทำ PR แจ้ง ผ.บ. แล้ว							
3	สสน.	-	โครงการเพิ่มเสถียรภาพการจ่ายน้ำบนเกาะเกร็ด (ดำเนินการสำรวจและออกแบบให้สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค)	315	1.00	-														15	สบ. สง.1,2	ด.ค.56-ค.ค. 57	รอประสานงานขอทำการวางท่อในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด	ระหว่างหาข้อสรุป กอ. กับ สสน. เรื่องการแบ่งความรับผิดชอบของการจัดจ้าง						

หมายเหตุ

S&D	PM	A&E	C	X
-----	----	-----	---	---

แผนการสำรวจและออกแบบ

ขออนุญาต

จัดจ้าง/ประกวดราคา

ดำเนินการก่อสร้าง

X = % ผลงานที่ทำได้แต่ละเดือน

งานที่ยังไม่เริ่มต้นการ

งานที่สำคัญกว่าแผน

งานที่เป็นไปตามแผน

งานที่เสร็จสิ้นและเป็นไปตามแผน

งานที่เสร็จสิ้นแต่ล่าช้ากว่าแผน

งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จปี 56 แต่ยังไม่ได้จัดจ้าง และ/

หรือ รอข้อสรุปจากหน่วยงานภายนอก
